
Masterplan Pemanfaatan Lahan 4 Ha


1 ha zona kandang 10.000 ekor, 3 ha kebun pakan (jagung, indigofera, pagar hidup lamtoro), embung, dan unit pengolahan pakan untuk menekan biaya pakan.

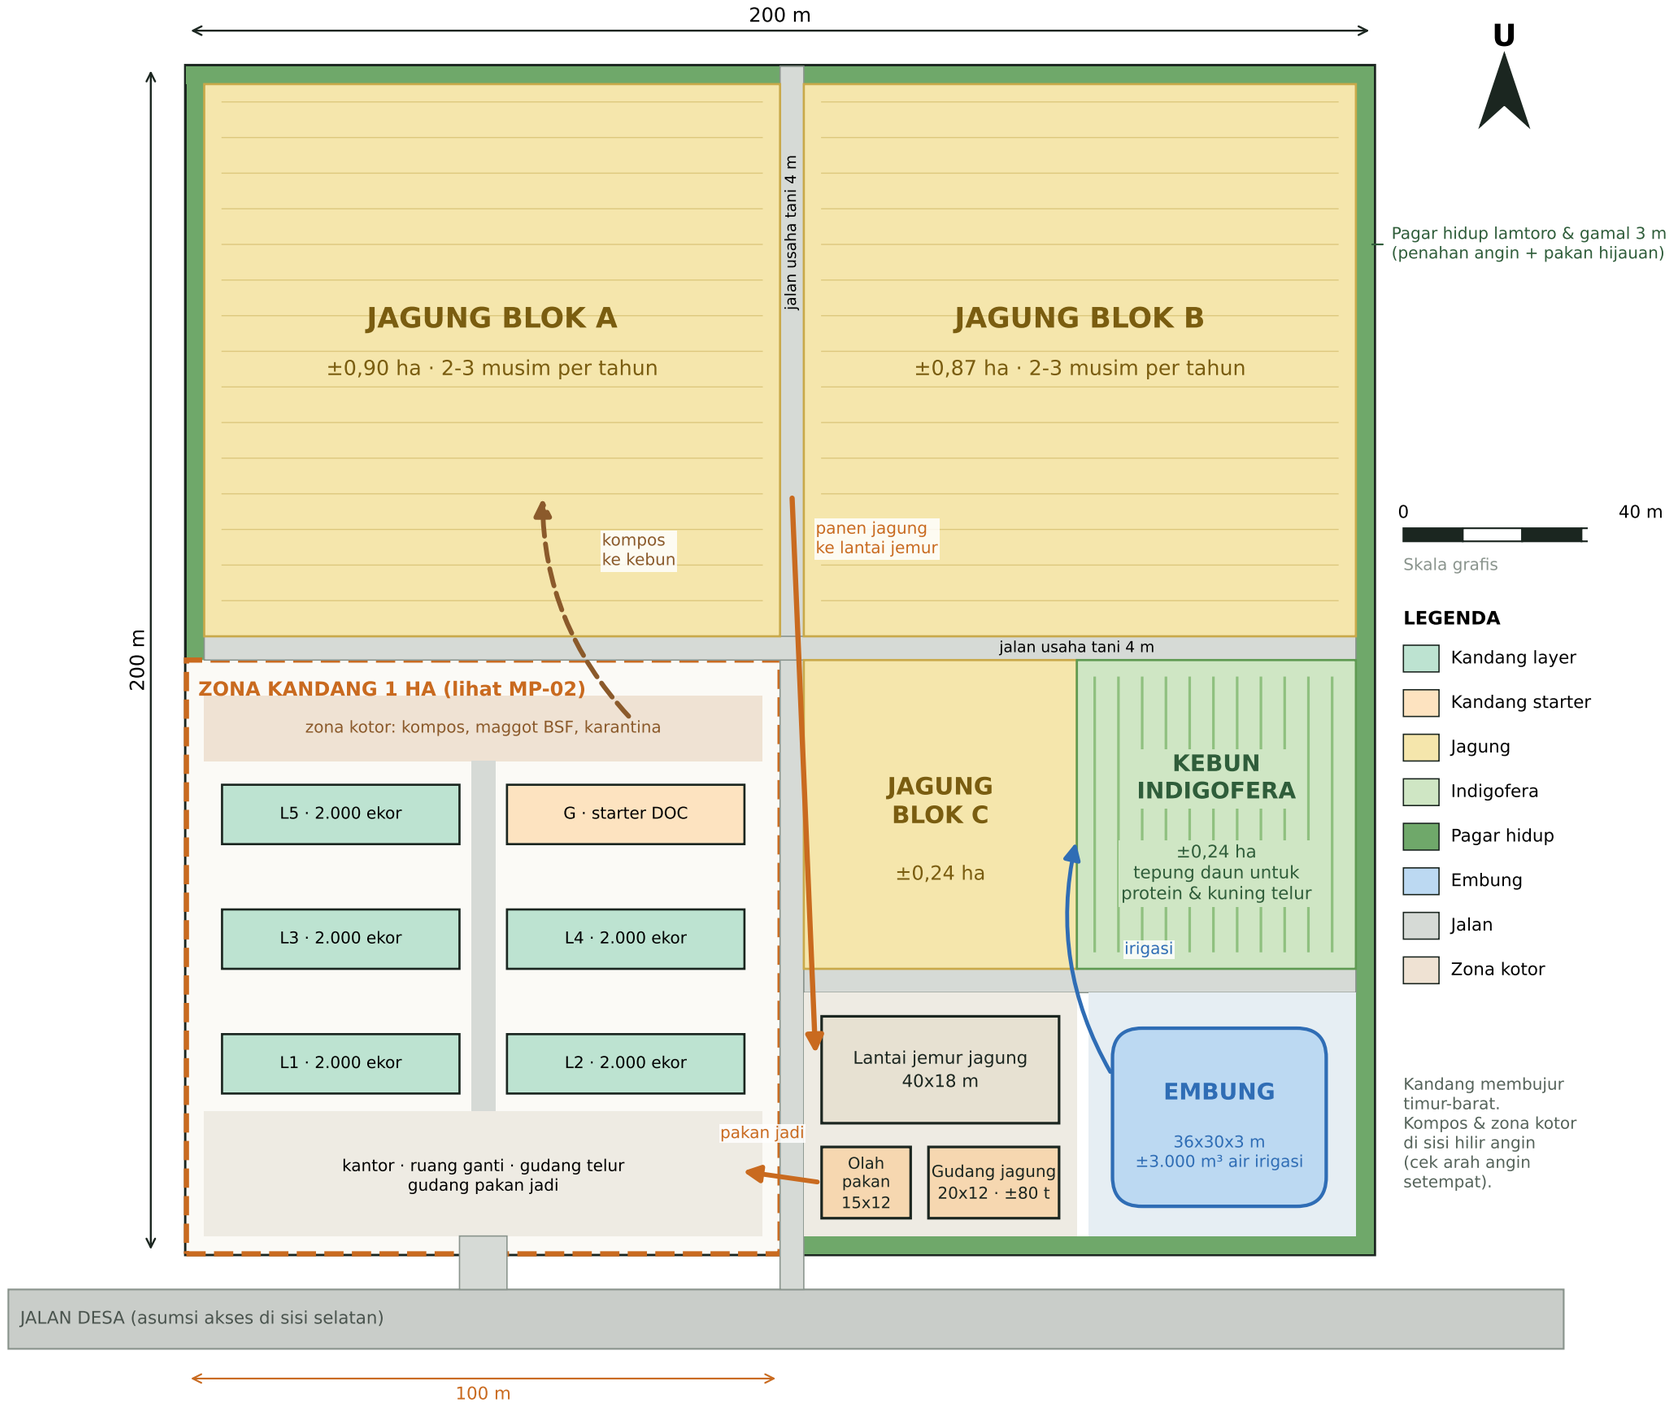

PROYEK	NO. GAMBAR	STATUS
Masterplan Lahan 4 Ha Adeva Farm - Ayam KUB Petelur 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan	**MP-01**	Rencana awal. Bentuk lahan diasumsikan persegi 200 x 200 m, sesuaikan dengan lahan asli.

Zona Kandang 1 Ha untuk 10.000 Ekor

5 kandang layer 10 x 40 m (2.000 ekor, 5 ekor/m²) + 1 kandang starter DOC untuk peremajaan bergilir. Zona bersih dan zona kotor dipisah pagar.

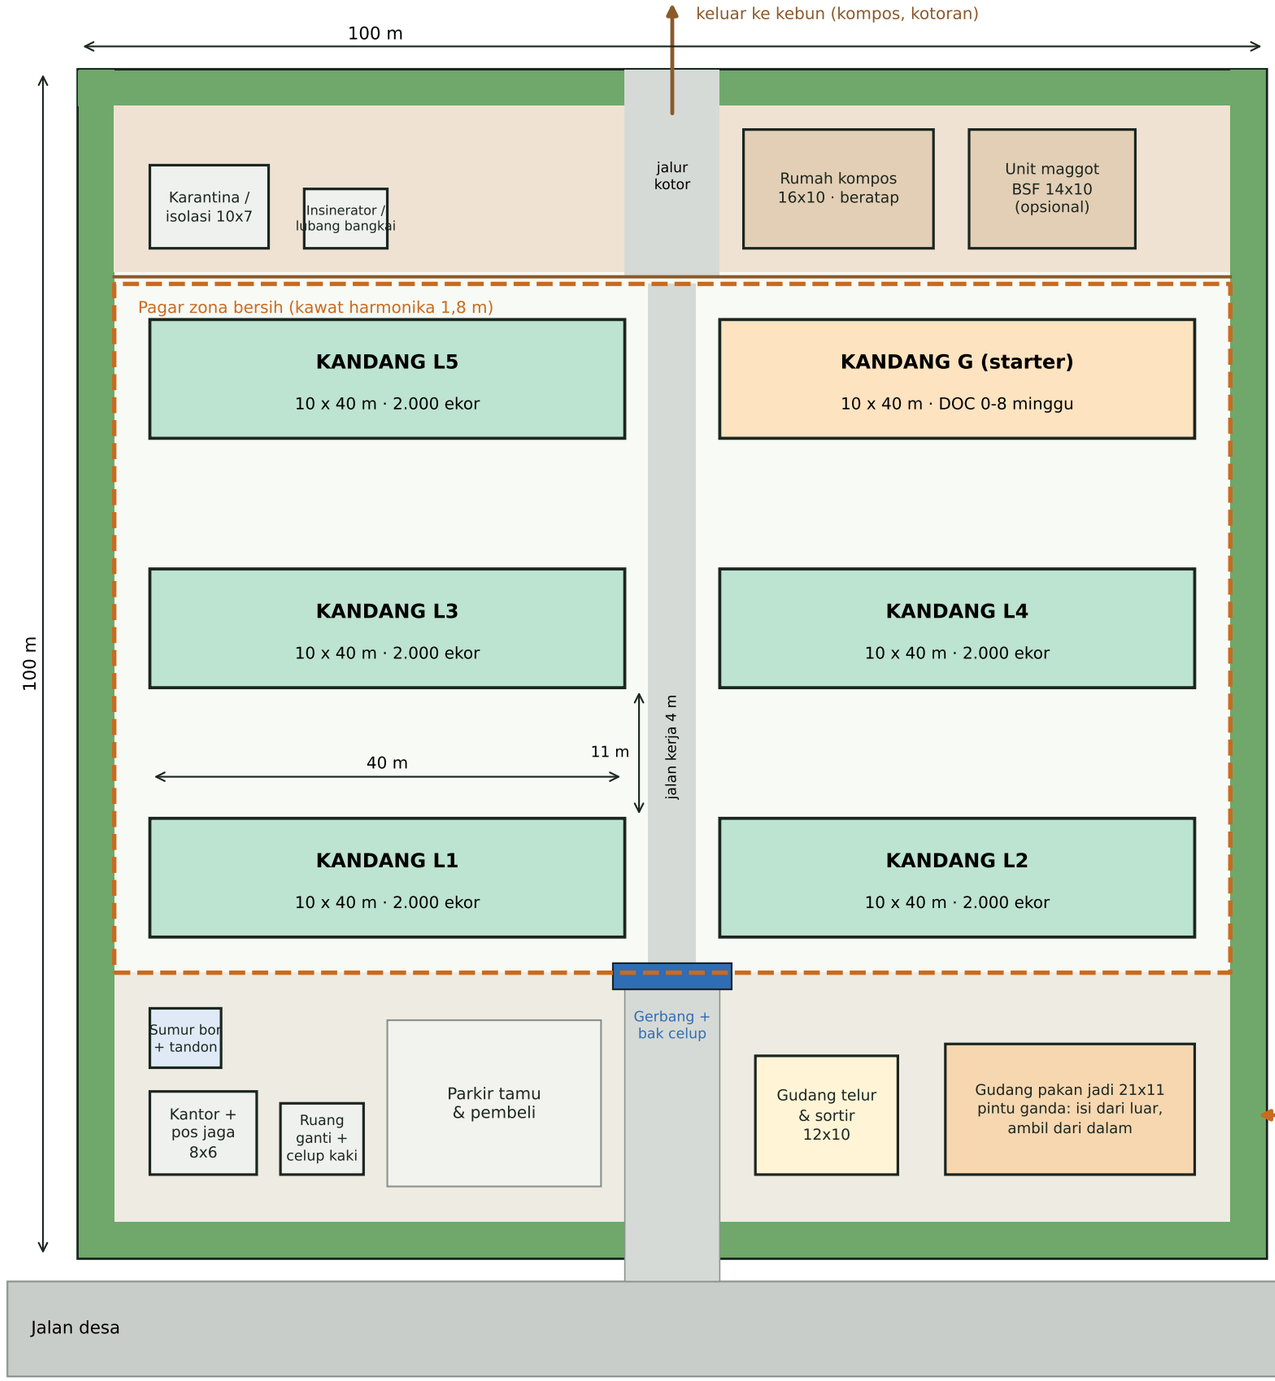

U

0 20 m

Skala grafis

Ketentuan:

- 5 ekor/m², kandang postal litter sekam seperti gambar G-02, dibuat dua kali lebih panjang (10 x 40 m).
- Jarak antarkandang 11-12 m.
- Peremajaan bergilir: 2.000 DOC dibesarkan di kandang G sampai 8 minggu, lalu pindah ke kandang L yang sudah diafkir dan dibersihkan.
- Orang masuk lewat ruang ganti; kendaraan lewat bak celup.
- Pembeli telur cukup sampai gudang telur, tidak masuk zona bersih.

PROYEK	NO. GAMBAR	STATUS
Masterplan Lahan 4 Ha Adeva Farm - Ayam KUB Petelur 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan	**MP-02**	Rencana awal. Bentuk lahan diasumsikan persegi 200 x 200 m, sesuaikan dengan lahan asli.


Neraca Lahan, Alur Pakan, dan Perkiraan Penghematan

Perkiraan untuk 10.000 ekor dengan racikan T2 (jagung 60%). Angka produksi dan biaya adalah taksiran perencanaan.

A. Neraca pemanfaatan lahan

Pemanfaatan	m²	ha	porsi
Zona kandang (6 kandang, gudang, kompos)	10.000	1,00	25%
Jagung blok A, B, C	20.060	2,01	50%
Kebun indigofera	2.440	0,24	6%
Embung dan tanggul	1.850	0,19	5%
Pengolahan pakan, gudang jagung, lantai jemur	1.890	0,19	5%
Pagar hidup lamtoro & gamal	1.770	0,18	4%
Jalan usaha tani	1.990	0,20	5%
Total	**40.000**	**4,00**	**100%**

B. Alur sirkular: kotoran jadi pupuk, kebun jadi pakan

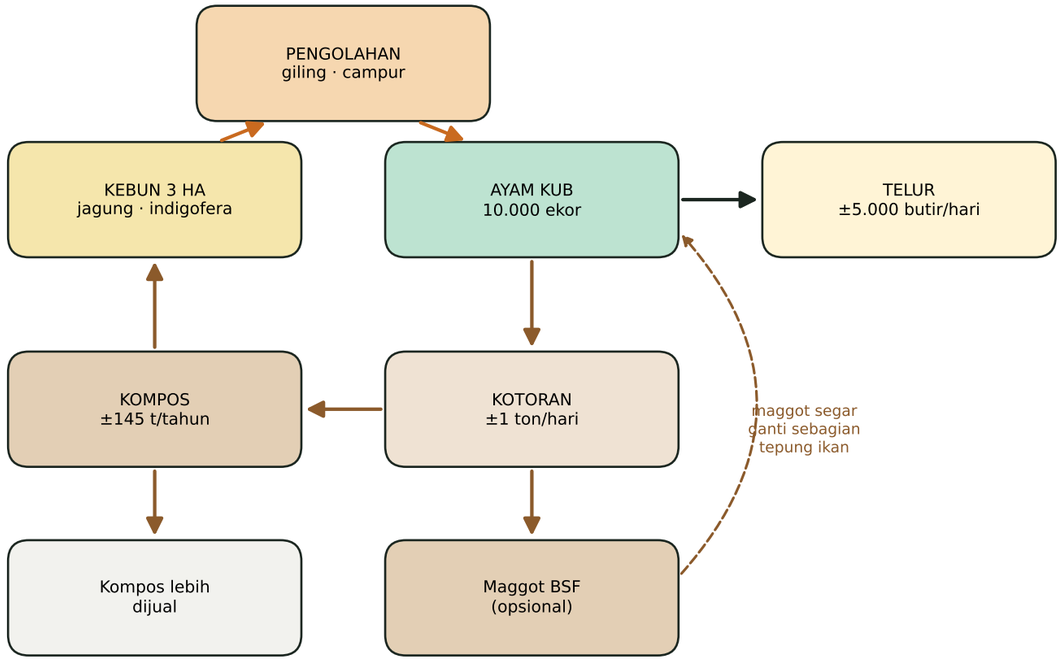

Jagung dari petani sekitar dibeli saat panen raya, disimpan di gudang jagung (±80 t), lalu diolah bersama hasil kebun sendiri.

C. Perkiraan hasil dan penghematan per tahun

Sumber	Hasil	Keterangan	Manfaat
Jagung kebun 2 ha, 2-3 musim	22-28 t	11-13% kebutuhan	Rp 92-116 jt
Indigofera + pagar hidup	±3 t	±20% kebutuhan	Rp 9 jt
Kompos (pakai ±25 t, jual ±120 t)	±145 t	pupuk kebun	Rp 72-75 jt
Maggot BSF segar (opsional)	±12 t	ganti ±10% t. ikan	Rp 20-30 jt
Beli jagung panen raya + gudang	±120 t	Rp 5.000 vs 6.500	Rp 180 jt
Total manfaat			**Rp 373-410 jt**

Kebutuhan jagung 10.000 ekor ±208 t/tahun (racikan T2). Biaya pakan racikan ±Rp 2,5 miliar/tahun, jadi manfaat di atas setara ±15% biaya pakan.
Tanpa strategi gudang jagung, manfaat dari lahan sendiri saja sekitar Rp 190-230 juta (±8-9%). Biaya jagung sendiri ±Rp 2.300/kg (tanam, kompos, pipil, jemur) dibanding beli Rp 6.500/kg.

D. Perkiraan investasi kebun dan pengolahan pakan

Komponen	Biaya
Embung 36x30x3 m (alat berat, tanpa geomembran)	Rp 60-90 jt
Sumur bor, pompa, pipa irigasi	Rp 40-60 jt
Bangunan pengolahan pakan 15x12 m	Rp 90-110 jt
Mesin: hammer mill, mixer 500 kg, pemipil, timbangan	Rp 60-75 jt
Gudang jagung 20x12 m + palet	Rp 150-180 jt
Lantai jemur 40x18 m	Rp 65-85 jt

Komponen	Biaya
Hand traktor dan alat tani	Rp 16 jt
Bibit indigofera, lamtoro, gamal	Rp 5-8 jt
Rumah kompos 16x10 m	Rp 45-60 jt
Unit maggot BSF (opsional)	Rp 25-40 jt
Total	**Rp 556-724 jt**
Balik modal (manfaat Rp 373-410 jt)	**±1,5-2 tahun**

Belum termasuk modal kerja stok jagung (±Rp 300 juta untuk 60 t) dan kandang 10.000 ekor (RAB hemat ±Rp 1,78 miliar). Harga perlu dicek ke kontraktor dan toko setempat.

PROYEK

Masterplan Lahan 4 Ha Adeva Farm - Ayam KUB Petelur 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan

NO. GAMBAR

MP-03

STATUS

Rencana awal. Bentuk lahan diasumsikan persegi 200 x 200 m, sesuaikan dengan lahan asli.
