
Masterplan Lahan 4 Ha (100 x 400 m)


Mengikuti sketsa lahan pemilik: jalan di depan, sungai melintang di hektare ke-4. Urutan zona dari jalan: servis - kandang semi umbaran - zona kotor - kebun - sungai.

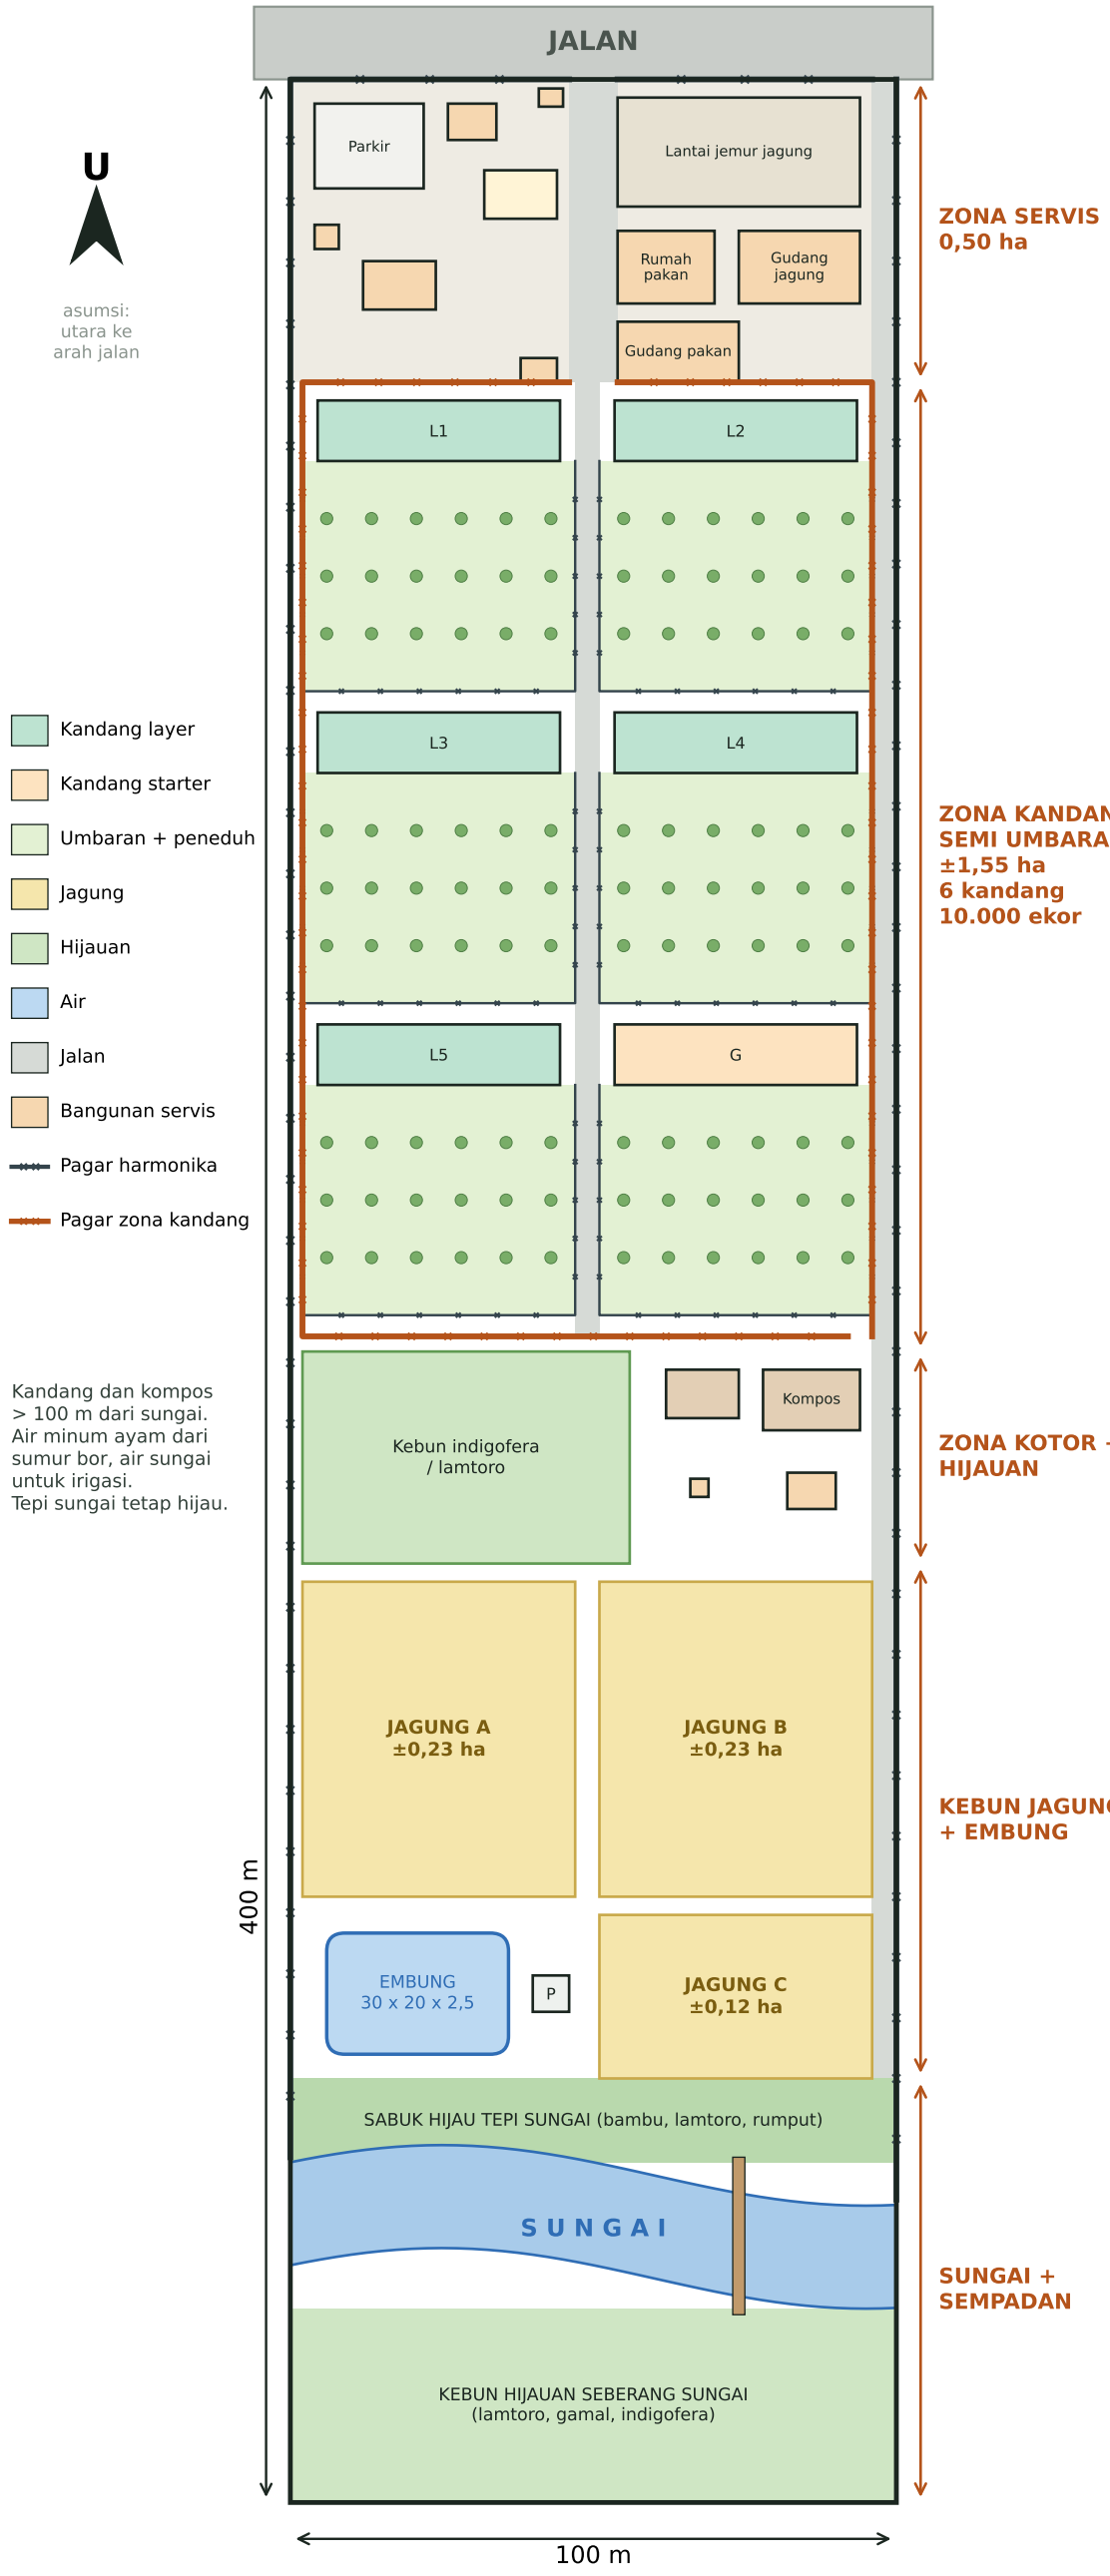

PROYEK	NO. GAMBAR	STATUS
Masterplan Adeva Farm - Ayam KUB Semi Umbaran 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan	**MP-01**	Lahan 100 x 400 m sesuai sketsa pemilik; ukur ulang di lapangan.

Zona Servis, Zona Kandang dan Zona Kotor

0 - 245 m dari jalan. 6 kandang 10 x 40 m, masing-masing dengan umbaran 45 x 38 m berpagar harmonika. Jalan servis 4 m di sisi timur menuju zona kotor dan kebun tanpa melewati zona kandang.

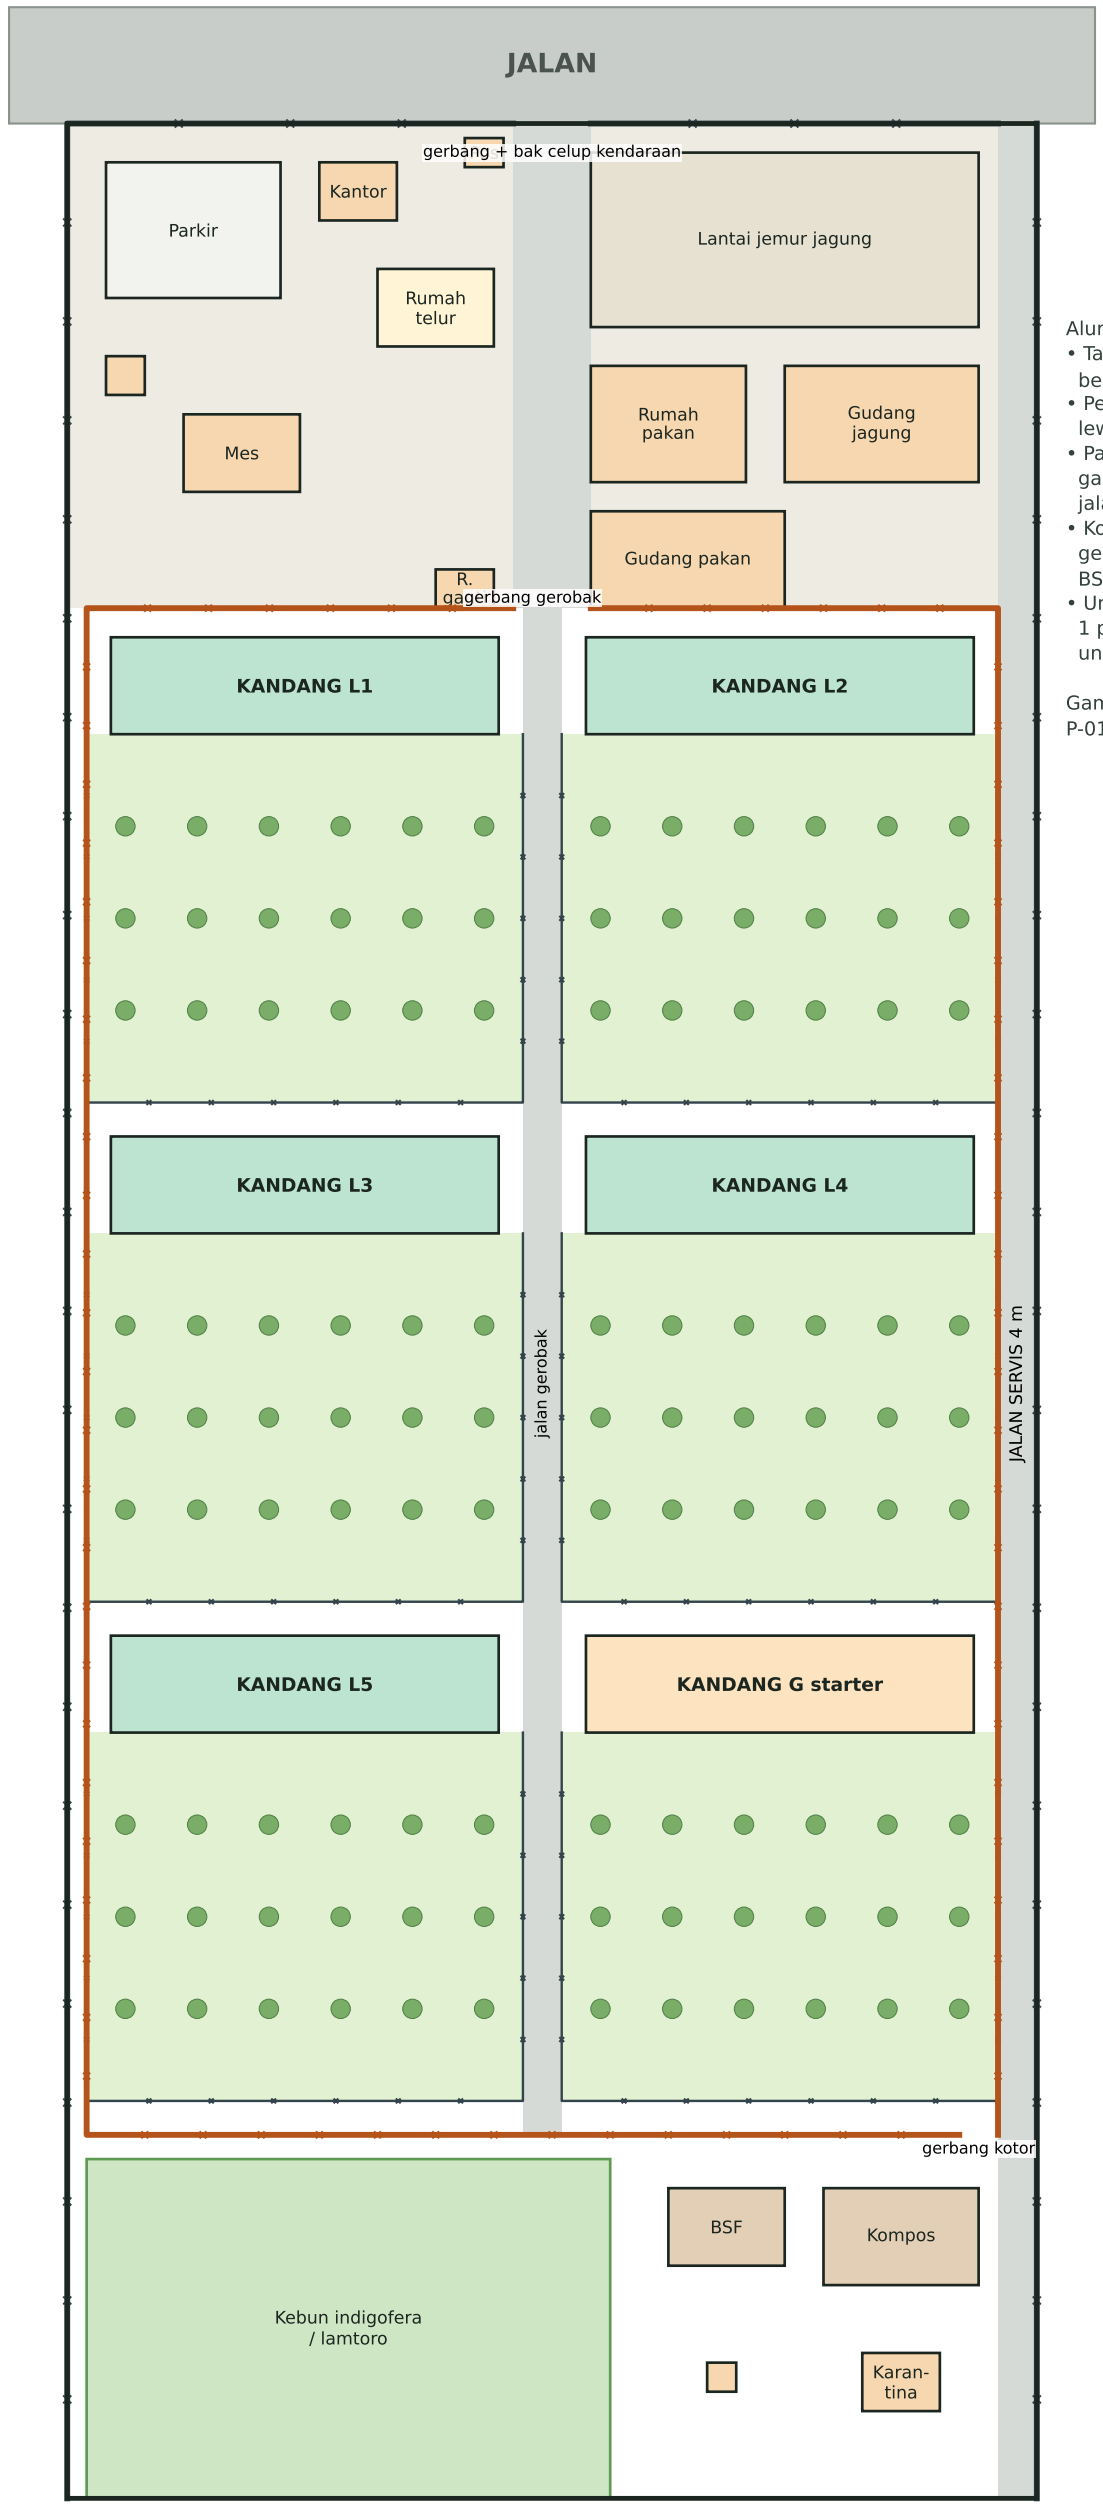

Alur kerja:
- Tamu, pembeli telur, truk pakan berhenti di zona servis.
- Pekerja masuk zona kandang lewat ruang ganti + celup kaki.
- Pakan dari gudang pakan (pintu ganda) dibawa gerobak lewat jalan gerobak.
- Kotoran & bangkai keluar lewat gerbang kotor ke kompos, BSF, insinerator.
- Umbaran dibuka pagi - sore, 1 petak (starter) jadi cadangan untuk digilir.

Gambar kerja: GT-02 S-02, S-03, P-01, P-02; GT-03 fasilitas.

PROYEK	NO. GAMBAR	STATUS
Masterplan Adeva Farm - Ayam KUB Semi Umbaran 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan	**MP-02**	Lahan 100 x 400 m sesuai sketsa pemilik; ukur ulang di lapangan.


Neraca Lahan, Alur Pakan, Penghematan dan Rekap RAB

Lahan 100 x 400 m sesuai sketsa. Angka biaya dari RAB Excel (harga perkiraan Konawe Selatan 2026); manfaat adalah taksiran perencanaan.

A. Neraca pemanfaatan lahan

Pemanfaatan	m²	ha	porsi
Zona servis (bangunan, lantai jemur, parkir)	4.800	0,48	12%
Kandang 6 unit 10 x 40 m	2.400	0,24	6%
Umbaran 6 x 45 x 38 m	10.260	1,03	26%
Jalan & jalur zona kandang, pagar hidup	2.700	0,27	7%
Zona kotor (kompos, BSF, karantina)	1.260	0,13	3%
Kebun indigofera / lamtoro	1.890	0,19	5%
Jagung blok A, B, C	5.895	0,59	15%
Embung + rumah pompa	1.215	0,12	3%
Jalan servis & jalan kebun	2.580	0,26	6%
Sabuk hijau tepi sungai	1.600	0,16	4%
Badan sungai (±17 m)	1.700	0,17	4%
Kebun hijauan seberang sungai	3.700	0,37	9%
Total	**40.000**	**4,00**	**100%**

B. Alur sirkular: kotoran jadi pupuk, kebun jadi pakan

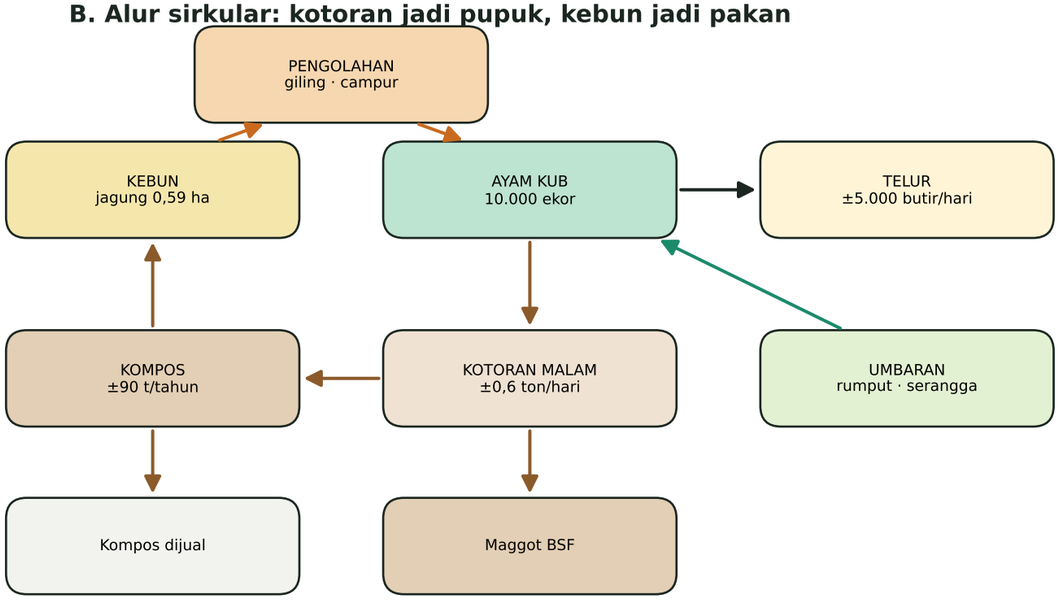

Jagung dari petani sekitar dibeli saat panen raya, disimpan di gudang jagung, lalu diolah bersama hasil kebun.

C. Perkiraan manfaat per tahun

Sumber	Hasil	Keterangan	Manfaat
Jagung kebun 0,59 ha, 2-3 musim	6-10 t	3-5% kebutuhan	Rp 27-41 jt
Ayam merumput di umbaran	3-5% pakan	bila umbaran berumput	Rp 75-125 jt
Lamtoro & indigofera (tepung daun)	±4 t	±30% kebutuhan	Rp 12 jt
Kompos dari kotoran malam	±90 t	jual ±84 t	Rp 50-51 jt
Maggot BSF segar (opsional)	±10 t	ganti ±10% t. ikan	Rp 15-25 jt
Beli jagung panen raya + gudang	±120 t	Rp 5.000 vs 6.500	Rp 180 jt
Total manfaat			**Rp 359-434 jt**

D. Rekap RAB pembangunan (Excel)

Komponen	Biaya
Kandang 6 unit (Rp 437 jt per unit)	Rp 2.624 jt
Bangunan pendukung (11 bangunan)	Rp 2.124 jt
Pagar harmonika, gerbang, umbaran	Rp 478 jt
Utilitas: lahan, jalan, jemur, air, embung, listrik	Rp 400 jt
Biaya tak terduga 5%	Rp 281 jt
TOTAL (termasuk biaya umum pemborong 10%)	**Rp 5.908 jt**
Per ekor kapasitas 10.000	Rp 591 ribu

Catatan biaya: kandang ±Rp 1,1 juta per m² (wajar untuk bangunan permanen beton + baja ringan), mahal per ekor karena sistem postal 5 ekor/m².
Pilihan hemat: bangun bertahap (3 kandang dulu), swakelola tanpa biaya pemborong (-9%), lantai tanah + kapur (-Rp 45 jt per kandang),
overstek 60 cm. Harga dasar di Excel wajib diganti dengan harga toko setempat sebelum dipakai.

PROYEK

Masterplan Adeva Farm - Ayam KUB Semi Umbaran 10.000 ekor - Kab. Konawe Selatan

NO. GAMBAR

MP-03

STATUS

Lahan 100 x 400 m sesuai sketsa pemilik; ukur ulang di lapangan.
